


[illegible]



№№ снятых пломб: —

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно  $U_{AB}$ ):

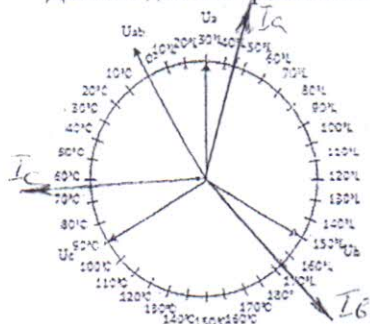

$I_a = 264$  mA,  $\varphi_a = 44^\circ$  Определено прямое чередование фаз на счётчике  
 $I_b = 633$  mA,  $\varphi_b = 167^\circ$   
 $I_c = 555$  mA,  $\varphi_c = 62^\circ$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

|                                                                   |                                                                            |                         |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| $P_{расч.} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$ | $P_{расч.} = 1,73 \times 0,418 \times 1,93 \times 0,94$                    | $P_{расч.} = 13,12$ кВт | Небаланс, %                                                      |
| $P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{тт} / (t \times A)$           | $P_{изм.} = 3600 \times \frac{10}{(10,5 \times 10000)} \times 40 \times 1$ | $P_{изм.} = 13,7$ кВт   | $Hб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\% = 4,4\%$ |

$I_a = 1,93$  A,  $I_b = 2,52$  A,  $I_c = 2,21$  A.  $I_{ср} = 1,93$  A.  $U_{AB} = 418$  В,  $U_{BC} = 418$  В,  $U_{AC} = 419$  В.

Постоянная счетчика (A) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 10,5 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужно подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):

«Парма ВАФ-А», №12593, 09.2019г., индуктиметр №103, 13.02.20г

Закключение:

Прибор учета ☒ - допущен, ☐ - не допущен в эксплуатацию.

В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполненные которых является условием для повторного допуска прибора учета).

На момент проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, все установленные пломбы и знаки визуального контроля не повреждены, следы вскрытия и снятия антимагнитной пломбы отсутствуют.

Срабатывание индикатора антимагнитной пломбы говорит о вмешательстве в работу прибора учета с целью искажения данных о потреблении электроэнергии, приводит к утрате прибором учета расчетного статуса. При выявлении срабатывания антимагнитных пломб или нарушении их целостности расчет потребленной электроэнергии будет произведен расчетным способом в соответствии с действующим законодательством.

Потребитель с принципом работы магнитных индикаторов ознакомлен и предупрежден о недопустимости воздействия на них магнитным полем.

Потребитель обязан обеспечивать сохранность всех установленных пломб и незамедлительно сообщать в адрес сетевой организации или гарантирующего поставщика о нарушении или срабатывании пломб, а также о неисправностях комплекса учета электроэнергии.

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись) Бугай А.А.
- ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись) Брылев Т.И.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись) \_\_\_\_\_
- Представитель собственника п/у Шибанов Н.С.
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись) \_\_\_\_\_
- Исполнитель (представитель) коммунальных услуг (Должность, Ф.И.О., подпись) \_\_\_\_\_

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия: \_\_\_\_\_

Судья-бонисты:

| № п/п | Наименование                | Подписание   |                  |
|-------|-----------------------------|--------------|------------------|
|       |                             | Способ учета | Ввод             |
| 1     | ООО «Венте» (с/магнитометр) | В ОДПУ       | ВА47-63, 3х 82 А |
|       |                             |              |                  |
|       |                             |              |                  |
|       |                             |              |                  |
