


1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
 Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{AB}):

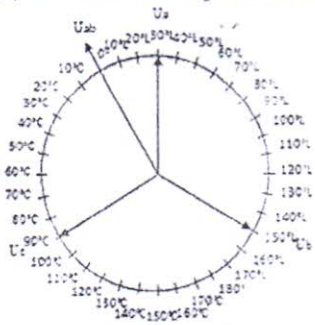

$I_a = \underline{\hspace{2cm}}$ mA, $\varphi_a = \underline{\hspace{2cm}}$ ° Определено _____ чередование фаз на счетчике.
 $I_b = \underline{\hspace{2cm}}$ mA, $\varphi_b = \underline{\hspace{2cm}}$ °
 $I_c = \underline{\hspace{2cm}}$ mA, $\varphi_c = \underline{\hspace{2cm}}$ °

нет нагрузки (резерв)

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$	$P_{расч.} = \underline{\hspace{2cm}}$ кВт	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} / \underline{\hspace{2cm}}$	$P_{изм.} = \underline{\hspace{2cm}}$ кВт	$Hб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\%$

$I_a = \underline{\hspace{1cm}}$ А, $I_b = \underline{\hspace{1cm}}$ А, $I_c = \underline{\hspace{1cm}}$ А. $I_{ср} = \underline{\hspace{1cm}}$ А. $U_{AB} = \underline{408}$ В, $U_{BC} = \underline{410}$ В, $U_{AC} = \underline{411}$ В.

Постоянная счетчика (А) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N _____ за время t _____ с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госпроверки):

„Парма ВАФ-А“, №12593, 09.2019г, индуктиметр №108 13.02.2020

Заключение:

Прибор учета - допущен, - не допущен в эксплуатацию.

В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполненные которых является условием для повторного допуска прибора учета).

На момент проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, все установленные пломбы и знаки визуального контроля не повреждены. следы вскрытия и снятия антимагнитной пломбы отсутствуют.

Срабатывание индикатора антимагнитной пломбы говорит о вмешательстве в работу прибора учета с целью искажения данных о потреблении электроэнергии. приводит к утрате прибором учета расчетного статуса. При выявлении срабатывания антимагнитных пломб или нарушении их целостности расчет потребленной электроэнергии будет произведен расчетным способом в соответствии с действующим законодательством.

Потребитель с принципом работы магнитных индикаторов ознакомлен и предупрежден о недопустимости воздействия на них магнитным полем.

Потребитель обязан обеспечивать сохранность всех установленных пломб и незамедлительно сообщать в адрес сетевой организации или гарантирующего поставщика о нарушении или срабатывании пломб, а также о неисправностях комплекса учета электроэнергии.

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись) Курсей А.А.
- ООО «Иркутскэнергобыт» (Должность, Ф.И.О., подпись) Брош А.И.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись) _____
- Представитель собственника ПУ Швидко Н.С.
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О, подпись) _____
- Исполнитель (представитель) коммунальных услуг (Должность, Ф.И.О, подпись) _____

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки. и причины такого отказа либо несогласия: _____

Судорожоненты:

№ и/и.	Наименование	Подписание	
		Сторона учета	Сторона
